

Resp. client:  
N° commande:  
N° client: 70520  
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: electricitecools@gmail.com

ProKo.: LS01  
N° rapport : 4436798-04  
N° rapp. prov.:  
Date: 27/02/2015

Client / Mandant :  
COOLS ELECTRICITE  
RUE DE LA CURE 2A  
1315 OPPREBAIS

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

**GENERALITES**

Appareil/Install. ID: \_\_\_\_\_ Type d'installation: existante \_\_\_\_\_ Type de locaux: Commu+chambres  
Lieu de contrôle: Av Bauduin 1<sup>er</sup>, 8/211 à 218 LOUVAIN-LA-NEUVE 1348  
Type de contrôle: visite de contrôle \_\_\_\_\_ Selon RGIE Art. 86/271/271bis  
Date du contrôle: 27/02/2015 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant 29/02/2040 Contrôleur: VANOVERBERG GILLES  
Propriété de: NC  
Installateur: Electricité Cools.  
T.V.A.: BE 0441.590.817. \_\_\_\_\_ Carte-ID : - \_\_\_\_\_ Délivré à: - \_\_\_\_\_ Date: - \_\_\_\_\_

**DESCRIPTION**

EAN n°: - \_\_\_\_\_ N° compteur: -- \_\_\_\_\_ Index I: -- \_\_\_\_\_ Index II: -- \_\_\_\_\_  
Raccordement: - \_\_\_\_\_ Fourreau: - \_\_\_\_\_ Plaque d'isolat.: - \_\_\_\_\_  
Tension de serv.: N 3 x 400V +  
Protection max.: 40A Protection principale : D2p63A Interr.: interr. diff. génér.  
Liaison comptage-coffre de repart.: type de câble: VVB nombre de conducteurs: 4 section: 10 mm<sup>2</sup>  
Câble de raccordement au réseau: type de câble: -- nombre de conducteurs: -- section: -- mm<sup>2</sup>  
Electrode de terre: type: Non visible. section: 16 mm<sup>2</sup> Résistance de dispersion: 22,4 Ohm  
Interrupteur Diff.: Général: 63A/300mA est plombé par des scelles d'OCB: p.a. Diff. supplém.: 2p 40A/30mA  
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général : 135,8 MOhm  
Installation exécutée conformément aux schémas : en ordre Etat du matériel électrique: en ordre  
Protection contre les chocs électriques: contact direct : en ordre contact indirect: en ordre  
Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre  
Description – appareils :  voir les schémas en annexe  schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation  
Ne sont pas encore placés:  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  - d'eau  
Ne sont pas encore raccordés:  liaison équipotentielle principale  - supplémentaire  
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 7

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

I | Néant.

**CONCLUSION**

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.  
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5


4

3

2

1 SONNERIE

TADQUE

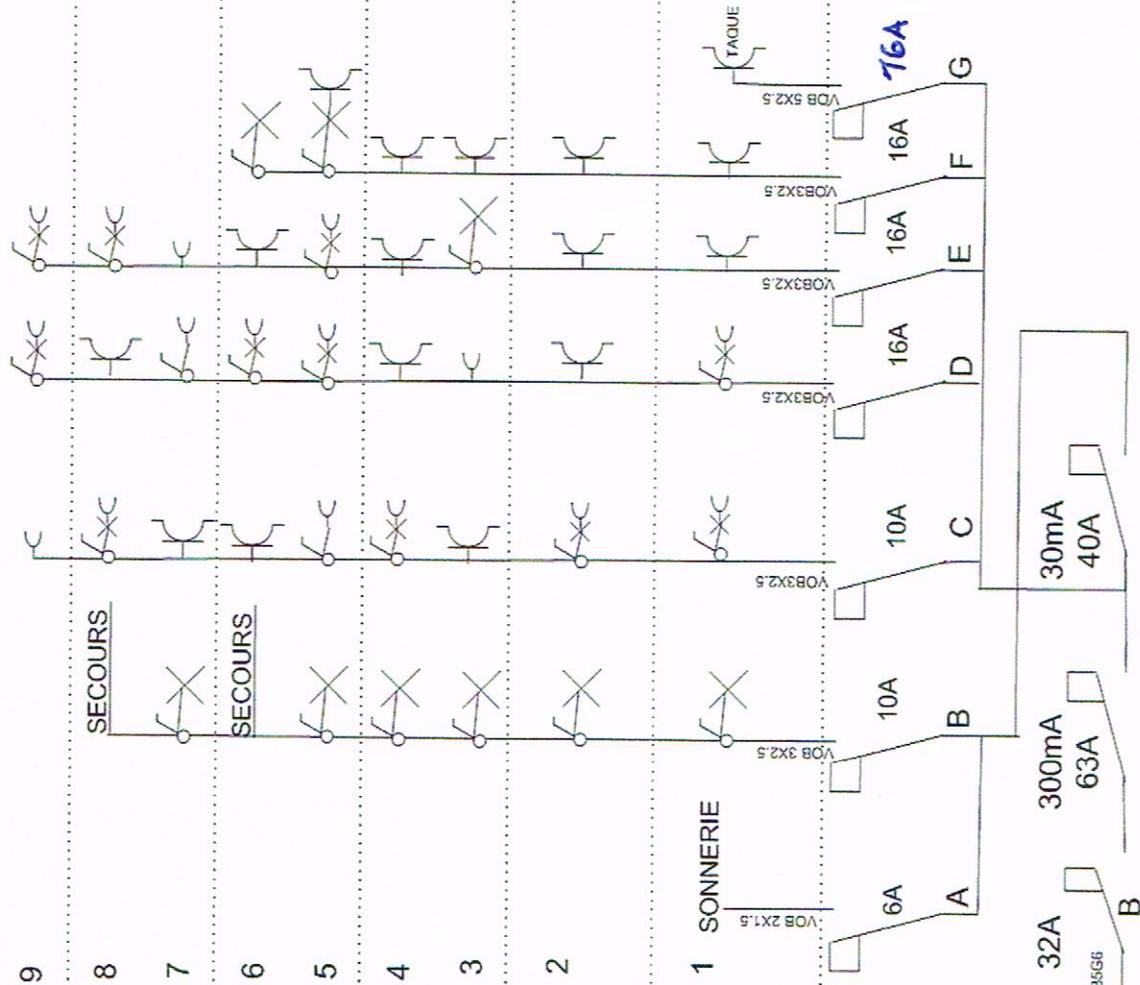

SECOURS


SECOURS

Installateur :  
 Electricité Cools SPRLU  
 Rue de la Cure, 2A  
 1315 OPPREBAIS  
 0477/72 46 20  
 TVA 0441.590.817

UNIFILAIRE  
 COMMU + CHAMBRES  
 8/211 à 218 Avenue Baudoin 1er  
 1348 LOUVAIN LA NEUVE

O.C.P.  
 VANOVERBERG Gilles  
 GSM: 0493/246.126  
 gilles.vanoverberg@ocb.be

BT 4436195-09  
 27102115

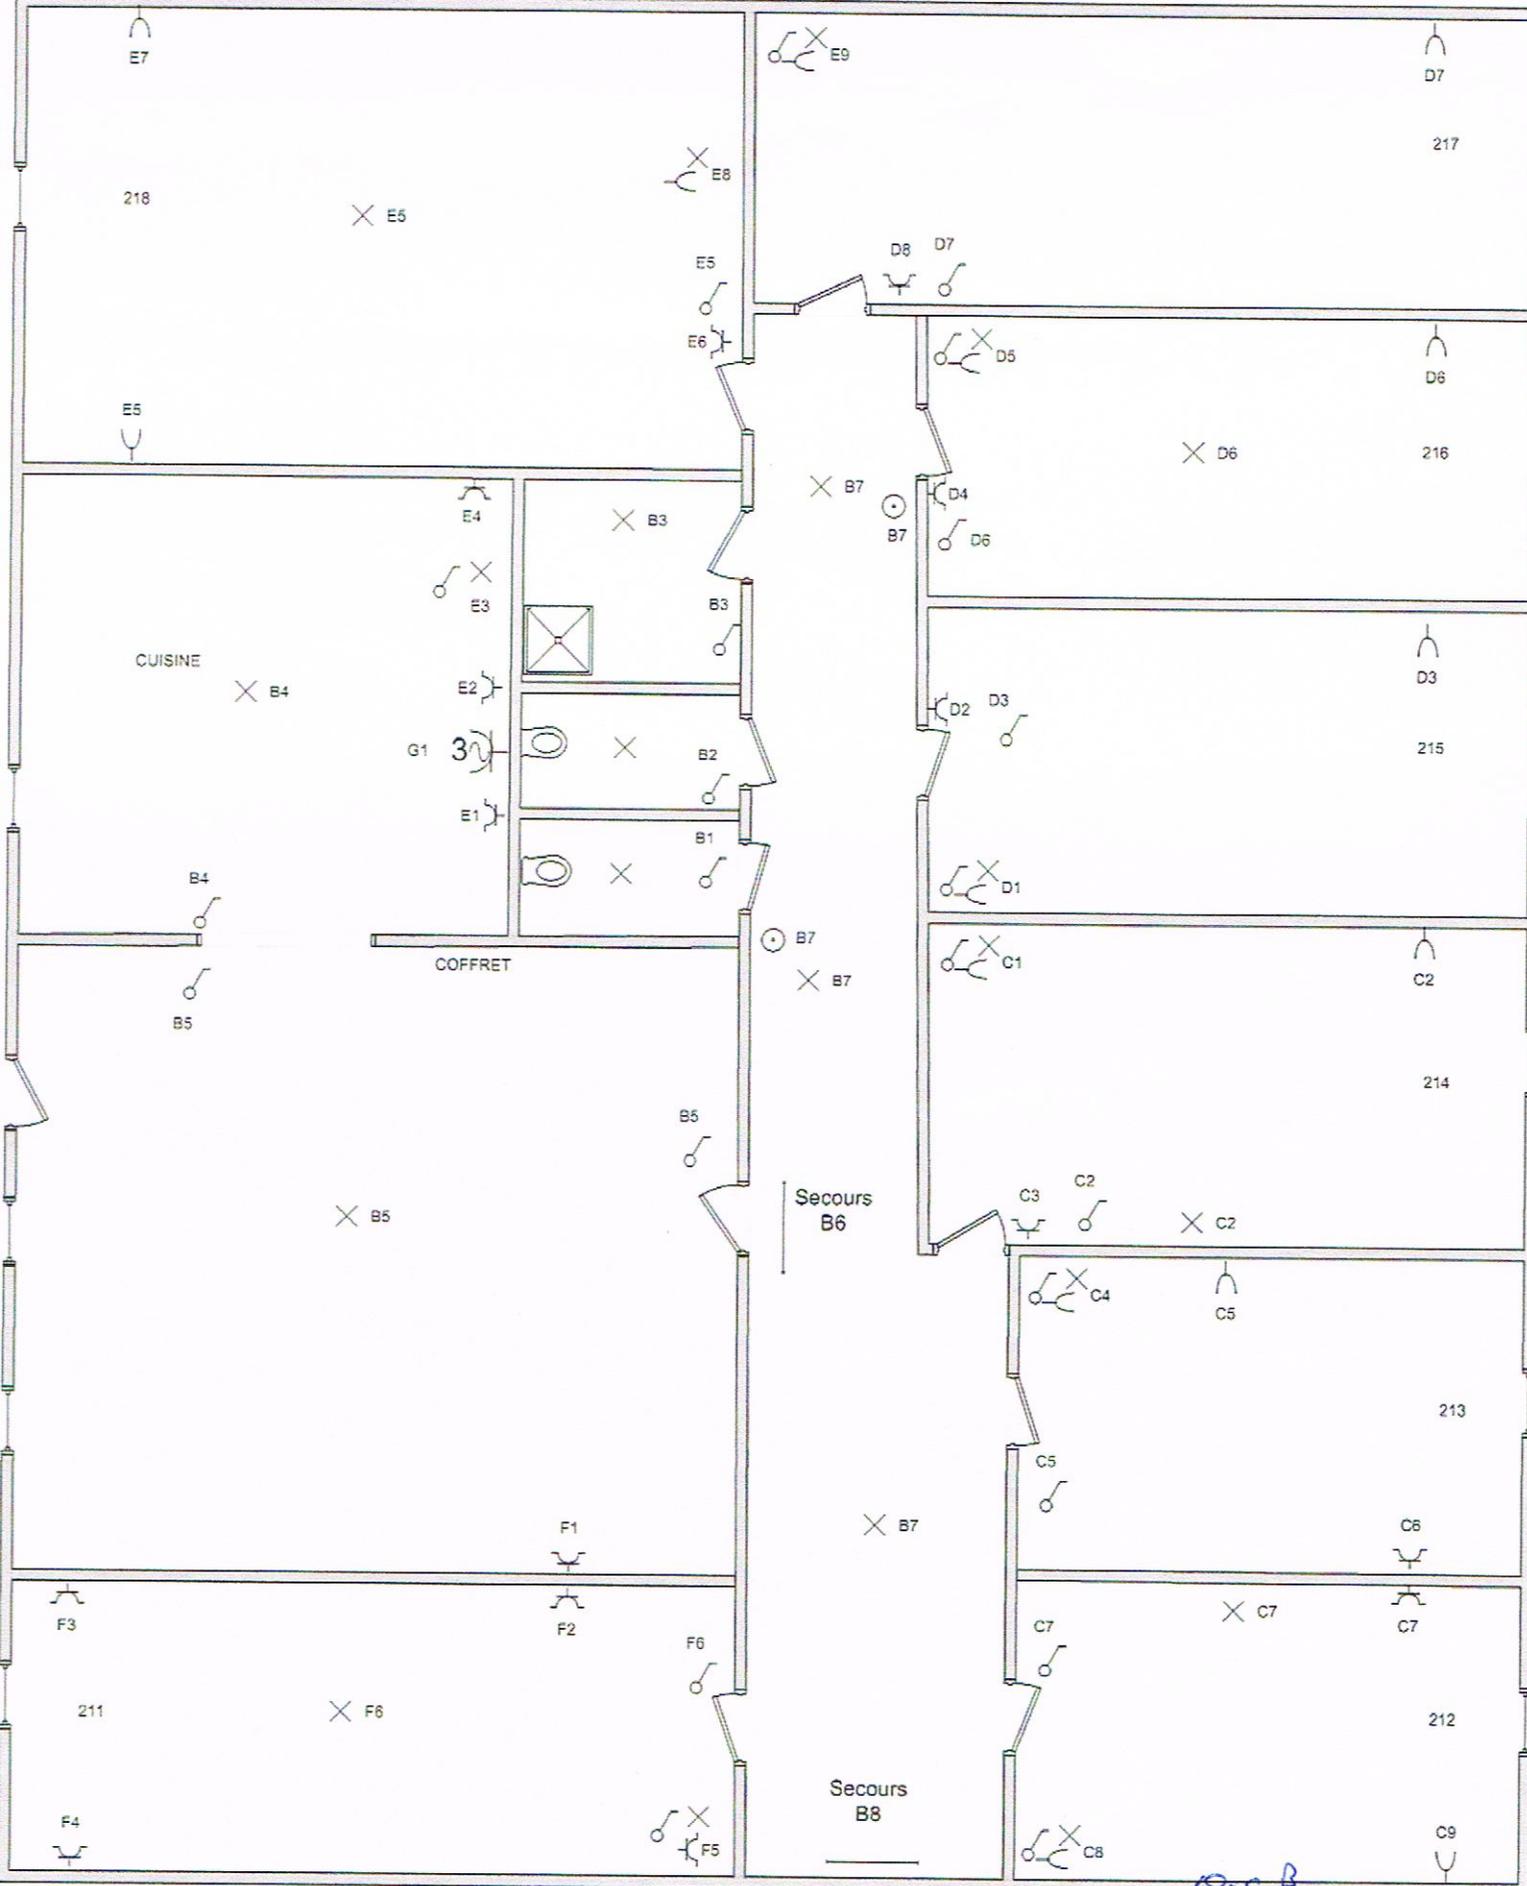

Installateur:  
 Electricité Cools sprlu  
 Rue de la Cure, 2A  
 1315 OPPREBAIS  
 0477/724620  
 TVA 0441.590.817

COMMU + CHAMBRES BÂTIMENT 414

Av Baudoin 1er 8/211 à 218  
 1348 LOUVAIN LA NEUVE

VANOVERBERG Gilles  
 GSM: 0493/246.126  
 gilles.vanoverberg@ocb.be

RT 4436938-04  
 23/10/2025
