

N° client société distributrice :
 N° compteur :
 Index I :
 Index II :

DISTRIBUTEUR	PV VU
Nom	
Date	
Signature	



Organisme de contrôle a.s.b.l.

3174758
PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
 suivant : RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / art. 271.1.b

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage / Modification de tension d'alimentation

Type de locaux : Commune / Chambres

Lieu d'inspection : Rue de la Chapelle 251 201 + 207 + 308 à 1147 Lavan La Neuve

Propriété de : Don communautaire

Mandant : M. Gode

Installateur : idem

TVA : 963 249 552 carte ID : Délivré à : Date :

Inspecteur : Vanoverberg G Date d'inspection : 24/08/2012

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V - 3 x 230 V 3N 400V Protection max. : Disj. 50A Commutateur; position :

Protection principale : Disj. : Disj. 50A Interrupteur / sectionneur : Disj. 63A 300mA

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : U10E nombre de conducteurs : 5 diamètre : 6 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : Don communautaire nombre de conducteurs : 5 diamètre : 6 mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau: présent / absent - Plaque d'isolation: présente / absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 13.3 Ω

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 6 Résistance d'isolement général : 22.5 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : Disj. 63A 300mA Supplémentaire : Disj. 63A 300mA

Description : voir les schémas en annexe

NOTES

La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.
 La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placés.

INFRACTIONS

Aucune


CONCLUSION


L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.
 L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d'O.C.B.
 Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et de position ont été signés pour approbation.
 La visite de contrôle prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 28/12/2012 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.
 L'installation ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
 l'inspecteur

VANOVERBERG Gilles
 GSM: 0493/246.126
 gilles.vanoverberg@ocb.be

NOTE AUX ENTREPRENDES: En vertu de l'art. 14 du CODEX, le présent document sera porté à la connaissance du comité.
 NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES: Conformément au RGIE vous êtes tenu (-) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique.
 3) de noter dans le dossier toute modification apportée à des personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.
 Affaires Economiques, direction « énergie électrique » tout accident survenant.
 03/005F/02/08/SD

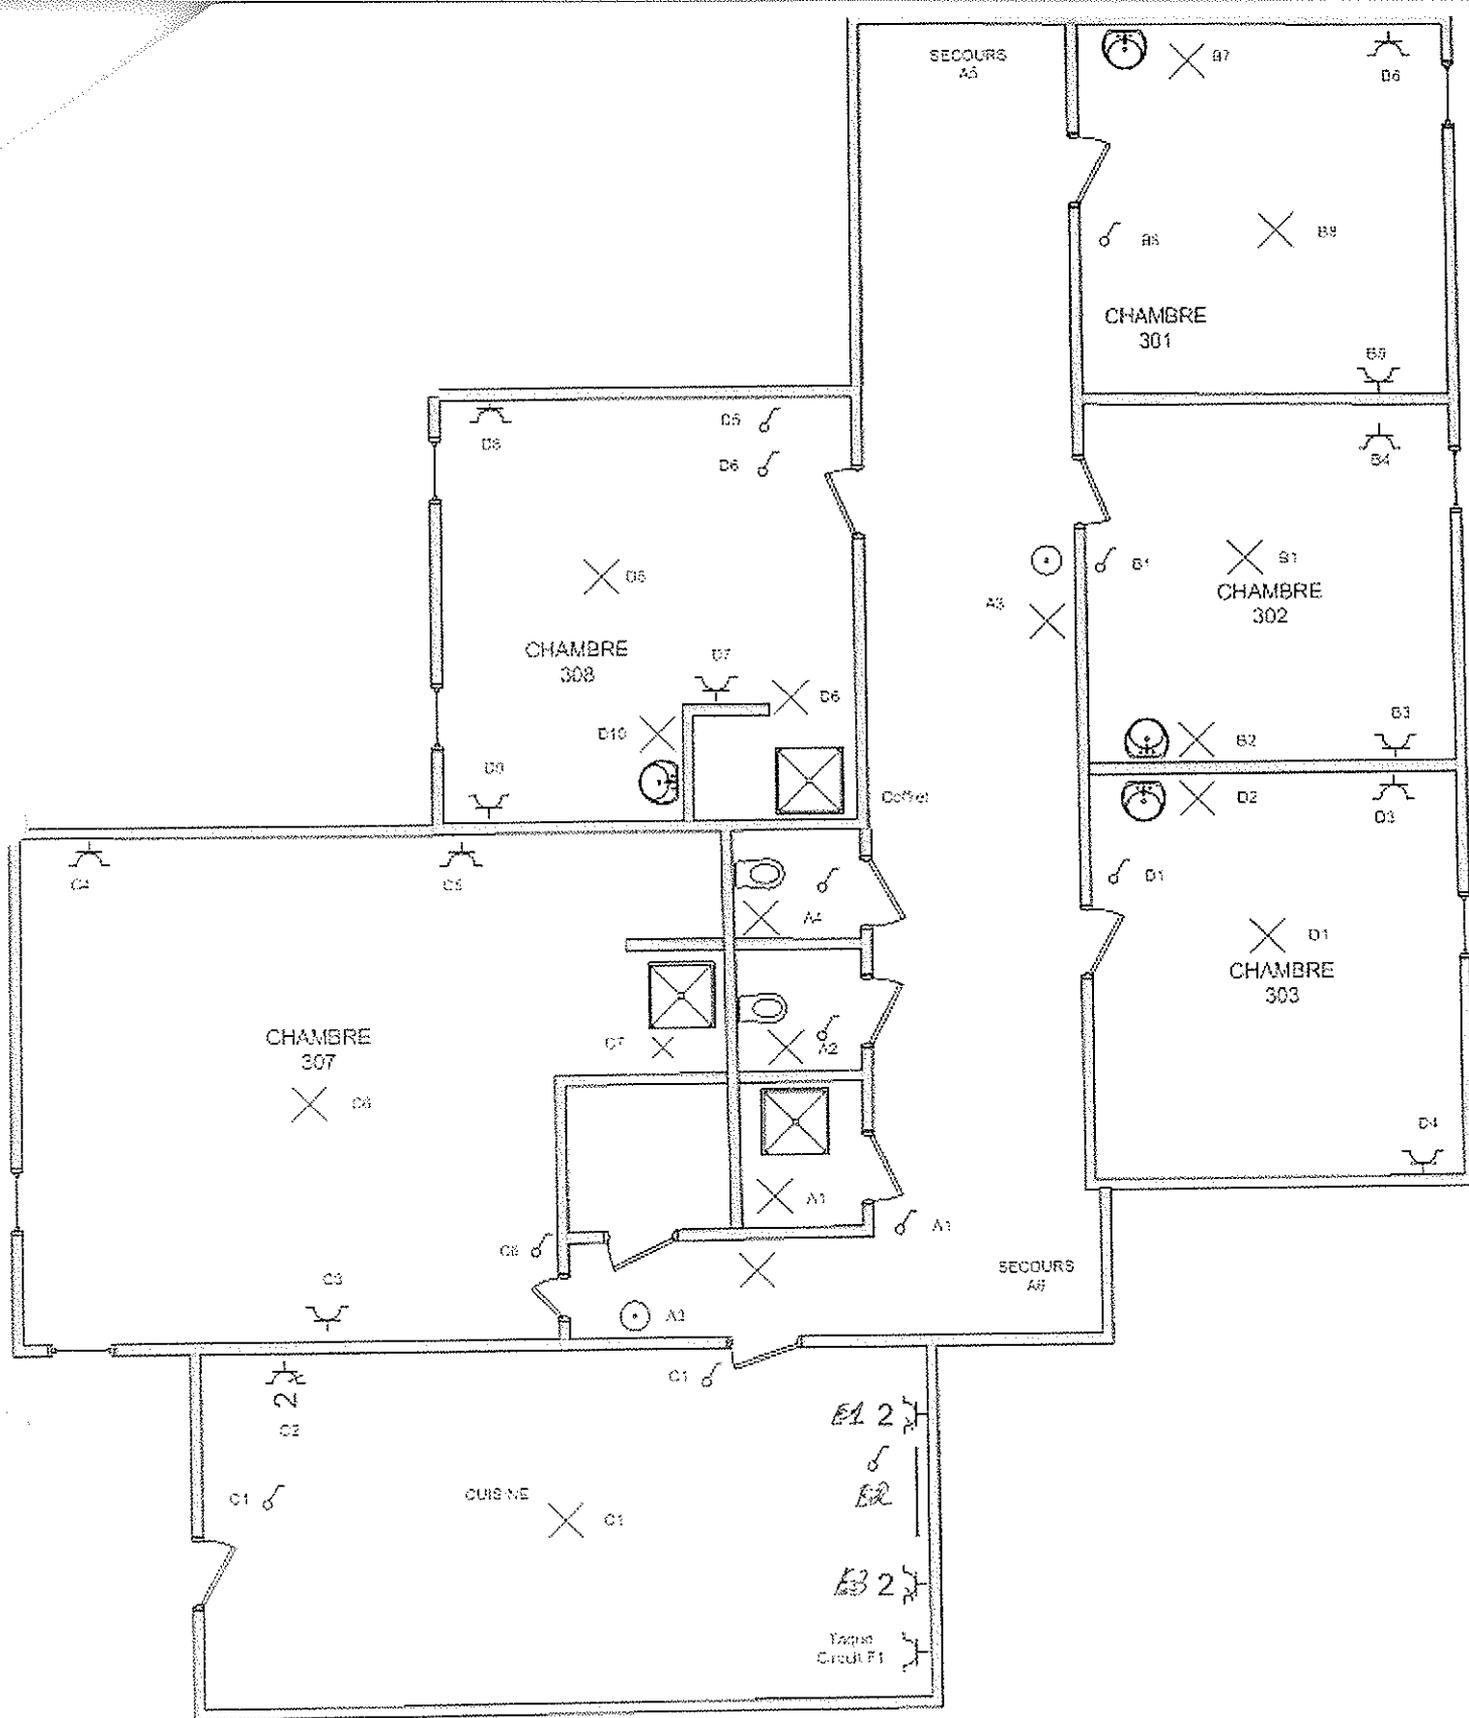

<p>Installateur: Electricité générale Cools Marc Rue des trois Burettes, 8 1435 Mont Saint Guibert 04771724620 TVA 867 249 383</p> 	<p>Installation: Communautaire + chambres Pl. Marjolaine, 25/301 à 303+307 1348 Louvain La Neuve</p>	<p>OCB Installation est contrôlée par: OCB, Av. Cardinal Mercier 82 - 5000 Namur Inspecteur : VANOVERBERG Gilles Date : 24/8/2011 PV n° : 3174758 Signature : </p>
--	---	--

ccub.

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6


5

4

3

2

1

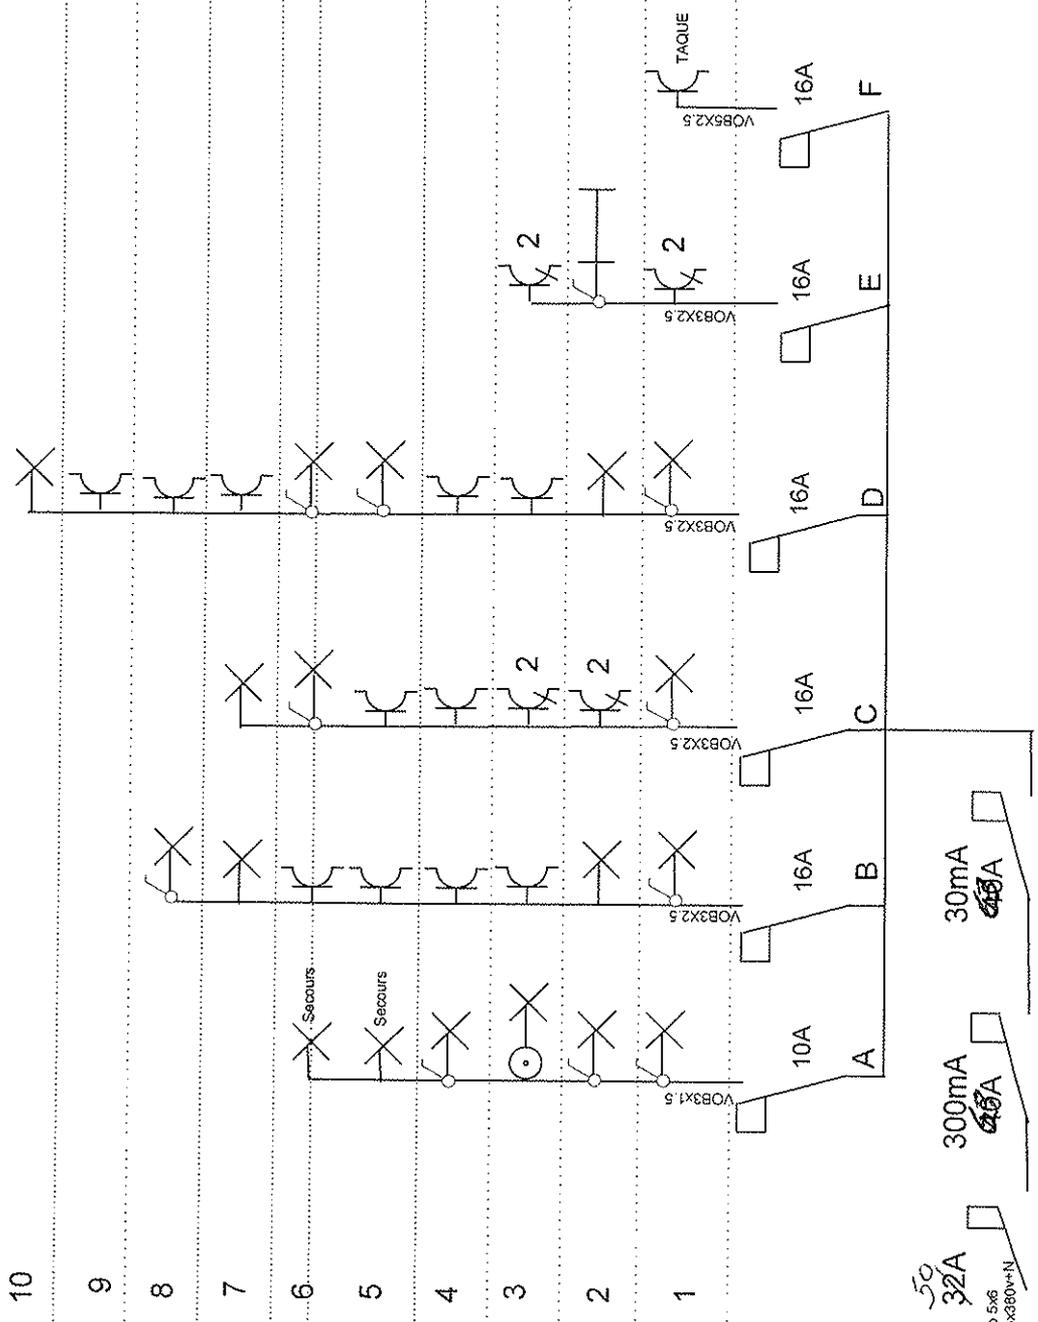

Installateur :
 Electricité Générale Cools Marc
 Rue des trois burettes, 8
 1435 Mont Saint Guibert
 047772 46 20
 TVA 867 249 383

Installation:
 Communautaire + chambres
 PI; Marjolaine, 25/301 à 303+307 à 308
 1348 LOUVAIN LA NEUVE

Installation est contrôlée par:
 OCB, Av. Cardinal Meurier 82 - 5000 Namur
 Inspecteur : VANOVERBERG Gilles
 Date : 24/8/2011
 PV n° : 3174758
 Signature :

50
 32A
 Vob 5x6
 Resau3x380V+N
